

平成30年7月豪雨災害

発災から5年間の主な取組



真光寺橋の開通
(令和4年7月)



呉市立天応学園開校記念式典
(令和5年4月)

令和5年7月5日
呉市災害復興本部

1 復旧・復興に関するこれまでの主な経過

平成30年 9月11日

呉市災害復興本部 設置
(復興総室・プロジェクトの設置)

【同月26日以降】災害復興部長会議を原則、毎週火曜日に開催

平成30年10月26日

第1回呉市復興計画検討委員会 開催

※東大復興デザイン研究体の羽藤英二教授が座長を務め、平成30年度・31(令和元)年度に計5回の会議を開催

平成31年 3月28日

呉市復興計画 策定

【平成30年12月～令和元年6月】
地区計画策定のためのワークショップ開催 (天応・安浦地区)

令和元年 9月27日

呉市復興計画(地区計画) 策定

復興計画に基づき、復旧・復興に向けた取組を推進

2 復旧・復興に向けた基本理念と基本方針

【基本理念】

～災害に強い幸せで魅力的な都市を目指して～

- ① 被災者の方々が被災前の当たり前の生活を取り戻すこと
- ② 被災したインフラなどの早期の回復
- ③ 市民や企業が、イキイキ・わくわくと活動することができ、市民が今後も住み続けたいと思えるまち
- ④ 観光客が訪れてみたいと思えるような交流都市

【基本方針】

1 住まいと暮らしの再建

- 被災者支援
- 子ども・子育て支援
- 廃棄物・土砂処理

2 災害に強い安全・安心なまちづくり

- 土木施設等の強靱化
- 公共施設等の強靱化
- 上下水道施設の強靱化
- 交通基盤の強靱化

3 産業・経済の復興

- 地域産業の復旧・復興

4 今後の防災・減災に向けた取組

- 防災・減災に向けた体制の強化

3 復興計画における各事業の進捗状況

【基本方針】

【施策】

【事業数】

基本方針	施策	新規	継続	ほぼ完了	完了	合計
		(※1)		(※2)		
1 住まいと暮らしの再建	(1) 被災者支援		3	5	17	25
	(2) 子ども・子育て支援		1		10	11
	(3) 廃棄物・土砂処理				7	7
2 災害に強い 安全・安心なまちづくり	(1) 土木施設等の強靱化	2	26	4	9	41
	(2) 公共施設等の強靱化		4	1	11	16
	(3) 上下水道施設の強靱化		4	1	5	10
	(4) 交通基盤の強靱化		5			5
3 産業・経済の復興	(1) 地域産業の復旧・復興		8	3	10	21
4 今後の防災・減災に向けた取組	(1) 防災・減災に向けた体制の強化	1	19	11	7	38
	合計	3	70	25	76	174

※1 令和5年度から実施（予定を含む。）する事業

※2 令和4年度末時点での進捗率が90%以上の事業

（呉市復興計画に基づく主な実施事業を計上：令和4年度末時点）

49 復旧事業の内、47 事業で「完了」「ほぼ完了」（約9割5分）※R5.6末現在

（令和4年度末現在 49 復旧事業の内、46 事業で「完了」「ほぼ完了」（約9割））

4 住まいと暮らしの再建に向けた取組①

(1) 被災者の生活支援と住まいの再建

※復旧事業については「完了」
又は「ほぼ完了」

- 地域支え合いセンターは、支援対象である仮設住宅入居世帯等が、全て在宅生活に移行したため、**令和4年3月末をもって閉所**

被災者の生活支援・
見守り・心のケア

引き続き、保健師等による被災者の相談対応や見守り活動を継続して実施

(2) 完了又はほぼ完了した主な事業

- 令和3年度までに完了
- ◆ 令和4年度完了
- ほぼ完了

取組区分	事業名
①生活再建支援	○災害弔慰金，災害見舞金等の支給 ◆災害義援金の受付・配分 ○災害援護資金の貸付け及び利子補給 ■被災住宅の応急修理 ○市税の減免 ■保険料，保育料，上下水道料金等の減免

※本資料は特段の表記がない場合、令和5年5月末時点の状況を示す。

4 住まいと暮らしの再建に向けた取組②

(2) 完了又はほぼ完了した主な事業

- 令和3年度までに完了
- ◆ 令和4年度完了
- ほぼ完了

取組区分	事業名
②恒久的な住まいの再建	<ul style="list-style-type: none"> ■ 住まいの再建に関する総合相談の実施 ■ 応急仮設住宅等への一時入居支援 ◆ 被災者への中古住宅取得支援
③安心・安全な児童福祉施設の復旧支援	<ul style="list-style-type: none"> ■ 被災児童福祉施設の復旧支援
④児童・生徒の心のケア	<ul style="list-style-type: none"> ■ 心の元気を育てる体験活動の実施
⑤就学支援	<ul style="list-style-type: none"> ■ 被災児童・生徒の就学支援
⑥早急な家屋撤去と土砂等の撤去	<ul style="list-style-type: none"> ■ 半壊以上の被災家屋の公費撤去 ■ 被災家屋・土砂混じりがれきの撤去に関する費用償還 ■ 宅地内の堆積土砂・土砂混じりがれきの撤去 ■ 災害土砂の撤去・運搬・大分別
⑦災害廃棄物等の早期処理	<ul style="list-style-type: none"> ■ 災害廃棄物等の収集・分別・処分 ■ がれき混じり土砂の分別 ■ 災害廃棄物の海上輸送・処分

5 災害に強い安全・安心なまちづくりに向けた取組①

(1) 土木施設等の復旧・強化①

※橋りょう・河川は「ほぼ完了」
それ以外の復旧事業は「完了」

- 道路・公園の災害復旧は既に完了しており、橋りょう・河川の災害復旧については**全て工事着手**しており、残る工事はそれぞれ1件のみとなっている

※公共・単独災害復旧の合計(P6,P7)

□ 道路災害復旧

【実施件数:215件】



□ 橋りょう災害復旧

【実施件数: 17件】



□ 公園災害復旧【完了】

【実施件数:12件】

□ 河川災害復旧

【実施件数:155件】



※()は、令和4年5月末の進捗状況を記載。P7～P9も同様。

5 災害に強い安全・安心なまちづくりに向けた取組②

(1) 土木施設等の復旧・強化②

※ 農林水産基盤施設の内、水路災害復旧及びほ場整備以外の復旧事業は「完了」又は「ほぼ完了」

- 林道・ため池の災害復旧は既に完了しており、農道・農地は**完了率97%以上**、水路については**完了率81%**と着実に進捗している

□ 農道災害復旧

【実施件数：53件】




□ 林道災害復旧

【実施件数：57件】



□ ため池災害復旧

【実施件数：8件】




□ 水路災害復旧

【実施件数：65件】




□ 農地災害復旧

【実施件数：452件】



※令和5年6月末現在



※令和5年5月末現在では、完了率約87%

5 災害に強い安全・安心なまちづくりに向けた取組③

(1) 土木施設等の復旧・強化③

- 国・県による砂防・治山事業の実施
- 砂防・治山事業の緊急事業分の工事は全箇所完了し、再度の災害防止のための工事を実施中

○緊急事業 … 二次災害を防止するための工事




整備中の大屋大川遊砂地
(天応地区)

国土交通省広島西部山系砂防事務所提供

□ 砂防事業（国・県事業）

【計画数：35か所（国8・県27）】



□ 治山事業（国・県事業）

【計画数：67か所（国7・県60）】



災害復旧事業の進捗
状況の見える化

公共災害復旧工事や災害関連緊急事業等の進捗状況等を市ホームページ等で公表(概ね1か月ごとに情報を更新)

5 災害に強い安全・安心なまちづくりに向けた取組④

(2) 公共施設等の強靱化

- 天応小学校と天応中学校を一体化し、備蓄倉庫やシャワー室などの避難所としての機能も備えた天応学園が、呉市初の義務教育学校として令和5年4月に開校

※復旧事業については「完了」



(3) 上下水道施設の復旧・強化

- 水道施設及び工業用水道施設は全て完了、下水道施設はほぼ完了
- 災害時に安定した送水を実施するため、川尻地区の送水管路を整備

※復旧事業については「完了」
又は「ほぼ完了」

□ 水道施設の本復旧 【完了】

【実施件数： 271件】

□ 工業用水道施設の本復旧【完了】

【実施件数： 4件】

□ 下水道施設の本復旧

【実施件数： 37件】

着手済 37件
(36件)

完了 36件
(36件)

(約97%) → 100%

(約97%) → 約97%

5 災害に強い安全・安心なまちづくりに向けた取組⑤

(4) 交通の強化・確保・渋滞対策

□ 災害に強い交通体系の整備

- 広島呉道路4車線化整備 → 令和4年度 4車線化全事業区間工事着手
- 主要地方道呉平谷線（上二河～此原区間）の整備
→ 令和4年度 此原工区の供用開始, 上二河工区の橋りょう下部工工事着手

引き続き、早期整備について関係機関に要望

□ 災害に備えた新たな交通拠点の整備

- 一般国道31号呉駅交通ターミナル整備事業（令和3年4月 国直轄事業として事業化）
- 呉駅周辺地域総合開発（第1期）の実施事業者に「くれみらい」を選定（令和4年11月）
- 旧そごう呉店既存建物の解体着手（令和5年4月）

国のバスタプロジェクトの一環として、道・港・駅・まちが一体となる防災機能を備えた次世代型総合交通拠点の整備




呉駅周辺地域の全景を上空から見た景色

6 産業・経済の復興に向けた取組

(1) 観光の復興

- 令和元年7月の市内総観光客数は発災前の約8割まで回復
- 令和2～4年は、新型コロナウイルスの影響により観光客数が減少
- 元気な呉をPRし、積極的に観光客を呼び戻す取組を推進

各年7月の市内総観光客数

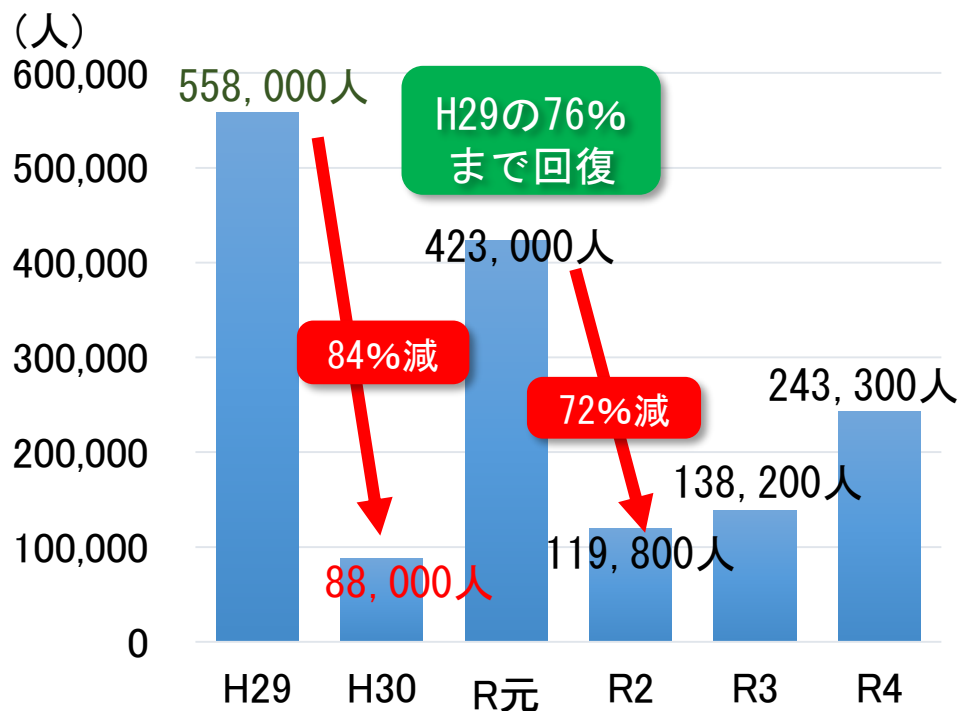

観光復興イベント

- 復興応援呉ご当地キャラ祭 (令和4年10月29日・30日)



復興応援呉ご当地キャラ祭

7 今後の防災・減災に向けた取組①

- 今後の災害に備え、避難情報等の伝達方法の見直しや、避難所の在り方の見直しをはじめ、防災力の向上に向けた取組を推進

(1) 情報伝達方法の見直し

□ ファクシミリ一斉送信

ファクシミリ一斉送信による
避難情報の発信（令和元年度～）

□ 防災行政無線の更新

川尻地区防災行政無線の機器
更新（令和3～4年度）

□ 一斉電話伝達サービス

固定電話等に向けた避難情報
伝達サービスの導入
（令和2年度～）

□ ハザードマップの配布

- ・WEB版ハザードマップの構築
（令和3年度）
- ・WEB版ハザードマップ多言語化
（令和4年度）

(2) 避難所の在り方を見直し

□ 避難所の環境(設備)改善

一部避難所の空調設備の改修やトイレの洋式化等を実施

7 今後の防災・減災に向けた取組②

(3) その他の取組

□ 呉市学校防災週間における取組

呉市立小中高等学校において、豪雨災害の記憶を次世代へ継承することを目的に、毎年7月6日を含む1週間を「呉市学校防災週間」として設定

□ 災害の記憶の継承

- ・ 豪雨災害の教訓や記憶を継承するため、説明板の設置や展示コンテンツを作成（令和4～5年度）
- ・ いなし広場（安浦地区）を一時避難場所、災害の教訓や記憶を継承する場所として整備（令和4～5年度）
- ・ 高潮等による災害時の一時避難場所、防災教育の場として天応西条第2公園（仮称）を整備（令和6年度以降着工予定）
- ・ 豪雨災害の主な被災箇所とその復興状況、新たに整備した砂防堰堤などの施設の紹介、被災箇所に設置する説明板の情報等や、それらを図示したデジタルマップなどのウェブサイトを市ホームページ内に作成（令和5年度）



引き続き、防災・減災に向けた取組を推進
